LE POINT SUR LES TRAVAUX

Réfection de l'allée du Luquet / Budget 420 K€ / Réalisation T2 à T3/2019

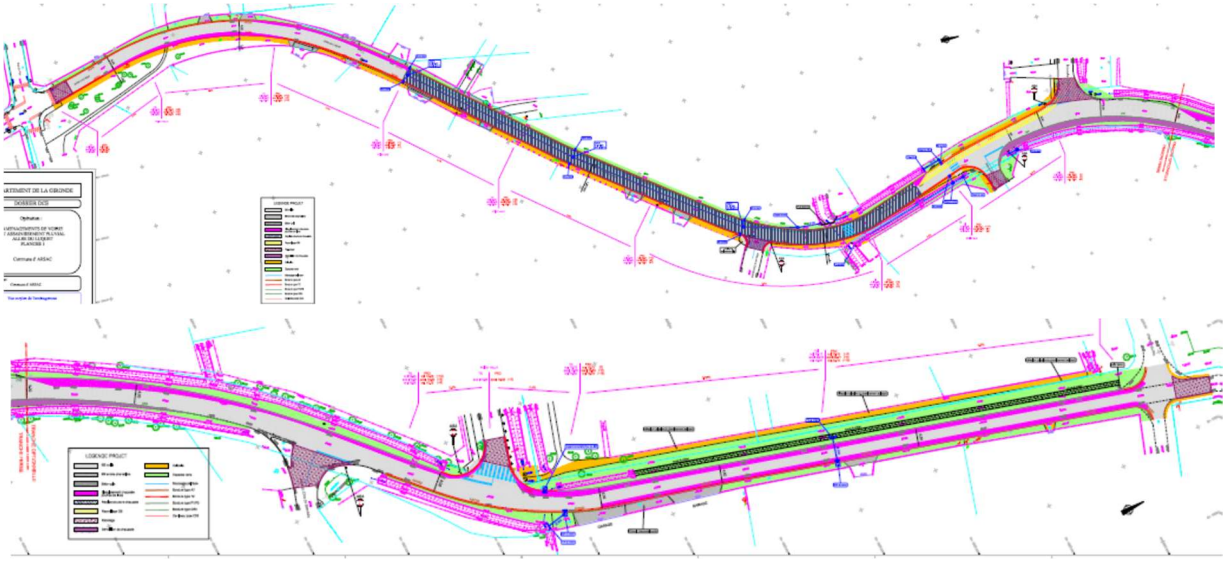

Les travaux sont terminés !

Réfection de l'avenue du Lac / Budget 550 K€ / Réalisation T2 à T4/2019

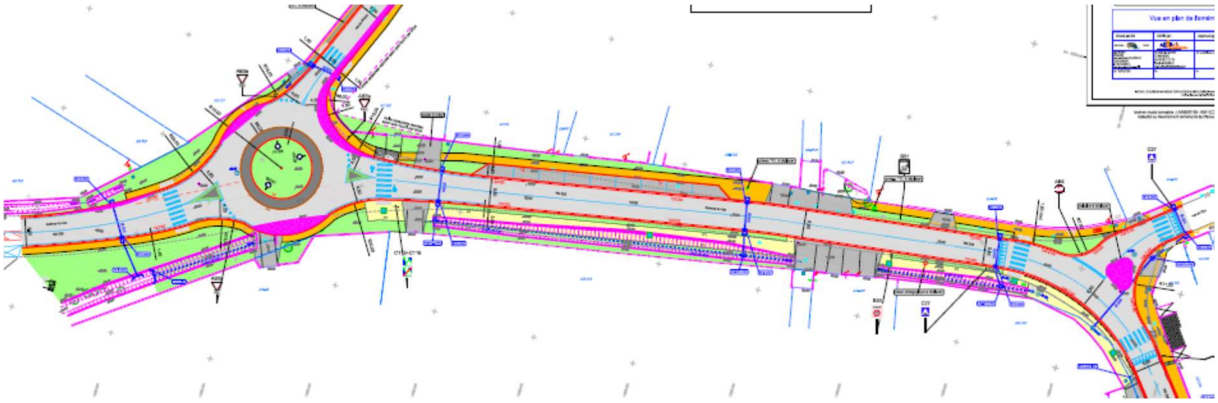

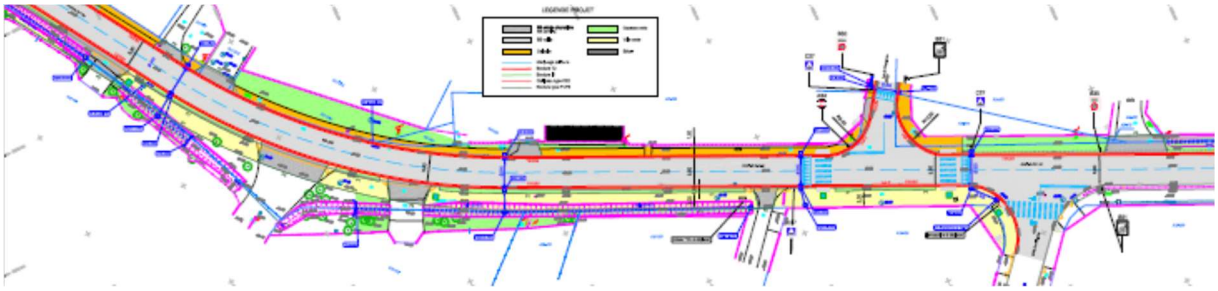

Les travaux sont en cours, les enfouissements des réseaux sont terminés et le busage du fossé pour permettre la réalisation de la voie verte sont en cours.

Ces travaux vont nécessiter de travailler en voie alternée et il sera nécessaire de fermer la voie sur de courtes durées pour permettre la réalisation des enrobés

Les centrales à bitume étant fermées pour maintenance de mi-décembre à mi-janvier , et en fonction des conditions climatiques, nous prévoyons de réaliser les enrobés dans la deuxième quinzaine de janvier 2020.

Aménagement du Quartier des Ecoles.

Ces travaux importants ont été particulièrement compliqués à organiser, dans une période de congés scolaires d'été de 7 semaines, compris le 15 Août. Cette période est toujours très délicate pour les entreprises et les approvisionnements.

Notre objectif principal était d'assurer de bonnes conditions de rentrée scolaire.

Nous avons donc commencé par travailler les abords directs des deux écoles et organiser les déplacements provisoires pour offrir un accès sécurisé aux bâtiments scolaires

Nous poursuivons avec l'aménagement des futurs accès et du parking des personnels enseignants et ALSH. En fonction des conditions climatiques, nous prévoyons de terminer cette phase de travaux en Novembre et devrions alors être en mesure de mettre en service les nouveaux accès aux écoles.

Nous terminerons par le parking derrière La Poste et prévoyons une fin des travaux en janvier 2020.

Création d'une nouvelle classe et d'un bloc sanitaire / Budget: 520K€ Réalisation: T1 et T2 /2019

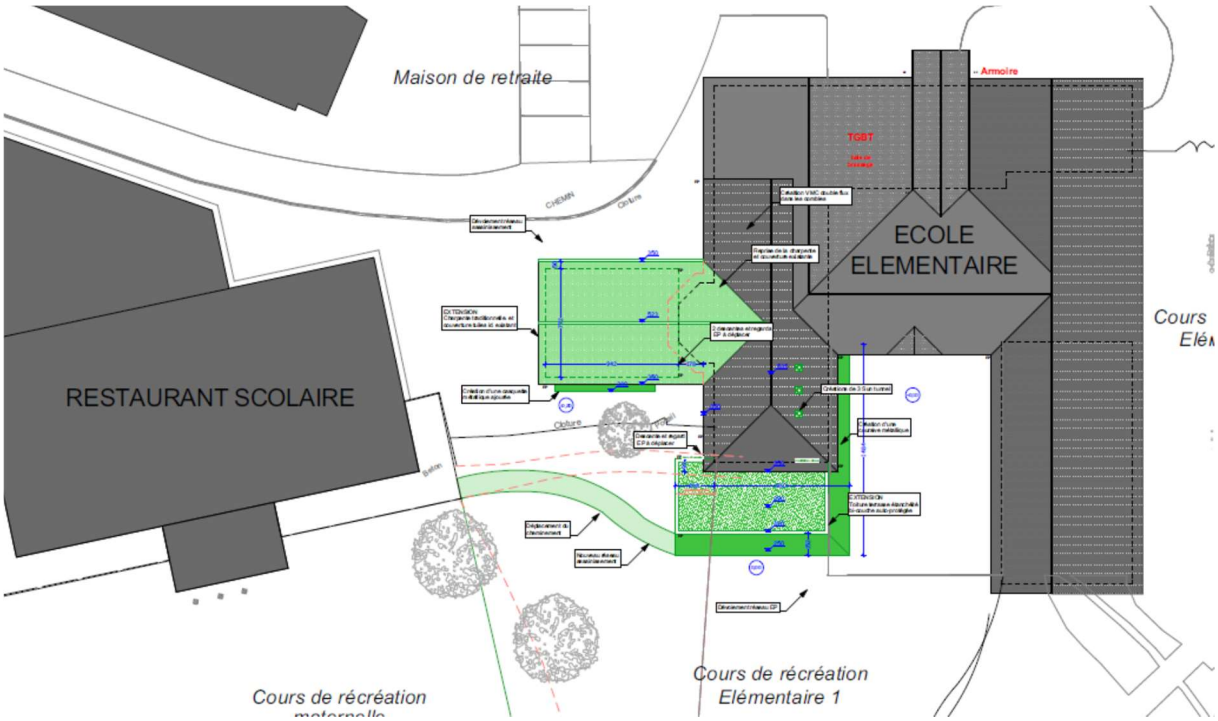

Les travaux sont maintenant terminés, la nouvelle classe a permis l'ouverture d'une classe supplémentaire de Maternelle et le nouveau bloc sanitaires est maintenant opérationnel.

Nous étudions maintenant la création d'une nouvelle classe sur l'emplacement de l'ancien bloc sanitaires afin de permettre l'éventuelle création d'une nouvelle classe élémentaire à la rentrée 2020.
